



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

MEMORANDO Nº 206/2024.

DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Ref: Contrato nº 008/2024

Tendo em vista solicitação de parecer quanto à primeira medição do Contrato nº08/2024, estamos nos manifestando favoráveis ao Boletim de Medição apresentada pela Contratada: Washington Timóteo de Lima Ltda ME, cujo objeto tem por finalidade a execução de Construção de Muro de Arrimo.

Segue como anexo: Boletim de Medição do Contrato e Relatório Fotográfico dos serviços realizados no período.

Sem mais pelo momento.

Pariquera-Açu, 18 de novembro de 2024.

Atenciosamente.

Paulo Henrique Barbosa

Diretor do Departamento de Obra



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obra civil de construção de muro de arrimo, muro de fechamento de 2 (dois) metros de altura e piso estrutural em concreto armado.

CONTRATO Nº: 008/2024

Contratada: Washington Timóteo de Lima ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Contratante: Câmara Municipal de Pariquera-Açu

RESUMO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº: 1ª	EVOLUÇÃO: 56,02%	STATUS: EM ANDAMENTO
FINANCEIRO		FÍSICO
VALOR CONTRATO	R\$ 104.000,00	100,00%
VALOR MEDIDO	R\$ 58.259,05	56,02%
VALOR ACUMULADO	R\$ 58.259,05	56,02%
SALDO CONTRATO	R\$ 45.740,95	43,98%

FOTOS



Foto 01



Foto 02



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br



Foto 06



Foto 07

PAULO HENRIQUE BARBOSA
Diretor do Departamento de Obras



PROF. MUN. PARQUEIRA-AÇU
Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Departamento de Obras
CREA 50813446283



Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP: 11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

**A CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU/SP
AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO.**

CONTRATO: 008/2024

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obra civil de construção de muro de arrimo, muro de fechamento de 2 (dois) metros de altura e piso estrutural em concreto armado

1ª MEDIÇÃO

A Empresa Washington Timóteo de Lima- ME, inscrita no CNPJ nº 20.638.118/0001-57. Através de seu proprietário Washington Timóteo de Lima, inscrito no RG nº 49.003.184-5; vem por meio desta solicitar a primeira medição do contrato acima mencionado. Planilha quantitativa dos serviços executados segue em anexo.

Pariquera-Açu, 11 de novembro de 2024

Atenciosamente,

WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:20638118
000157

Assinado de forma digital
por WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:20638118000157
Dados: 2024.11.11
11:08:12 -03'00'

Washington Timóteo de Lima-ME
CNPJ: 20.638.118/0001-57



Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP: 11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE PARQUEIRA-ACU				Data		Banco		R.O.L.		Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E MURO DE FACHADA DE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA COM CONEXÃO DE BOLSÕES DE AR QUE POSSAM TER SE FORMADO ENTRE A DIVISA MURADA E O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE INFLUÊNCIAS				SINAPI - 04/2024 - São Paulo		09/2024 - São Paulo		20,13%		Não Desonerado: Horizontal: 115,54% Mensalistas: 71,45%							
Item	Código Banco	Descrição	Orgamento Statístico	Und	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)	Quant.	%	Valor Total (R\$)	Quant.	%	Valor Total (R\$)	Quant.	%	Valor Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.159,32	6,63 %			R\$ 7.159,32			R\$ 7.159,32			R\$ -
1.1	103889	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.		m²	2,5	320,19	R\$ 804,50	0,83 %	2,50	100%	R\$ 804,50	2,50	100%	R\$ 804,50	0,00	0%	R\$ -
1.2	COTAÇÃO 2	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1		UN	1	1.992,50	R\$ 2.342,50	2,48 %	1,00	100%	R\$ 2.342,50	1,00	100%	R\$ 2.342,50	0,00	0%	R\$ -
1.3	97621	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL.		m²	12,74	150,55	R\$ 2.303,64	1,98 %	12,74	100%	R\$ 2.303,64	12,74	100%	R\$ 2.303,64	0,00	0%	R\$ -
1.4	85387	SINAPI COM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023		m²	12,74	101,41	R\$ 1.551,73	1,34 %	12,74	100%	R\$ 1.551,73	12,74	100%	R\$ 1.551,73	0,00	0%	R\$ -
2		MURO					R\$ 46.652,04	43,82 %			R\$ 46.652,04			R\$ 46.652,04			R\$ 29,31
2.1	96526	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).		m³	1,16	226,34	R\$ 541,86	0,47 %	1,76	100%	R\$ 541,86	1,76	100%	R\$ 541,86	0,00	0%	R\$ -
2.2	100324	SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA		m³	0,99	152,65	R\$ 16,50	0,01 %	0,09	100%	R\$ 16,50	0,09	100%	R\$ 16,50	0,00	0%	R\$ -
2.3	101173	SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM.		M	56	63,33	R\$ 4.259,36	3,67 %	56,00	100%	R\$ 4.259,36	56,00	100%	R\$ 4.259,36	0,00	0%	R\$ -
2.4	96533	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2		m²	84,36	80,76	R\$ 8.182,92	8,85 %	84,36	100%	R\$ 8.182,92	84,36	100%	R\$ 8.182,92	0,00	0%	R\$ -
2.5	104916	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.		KG	539,28	17,83	R\$ 11.545,98	9,95 %	539,28	100%	R\$ 11.545,98	539,28	100%	R\$ 11.545,98	0,00	0%	R\$ -
2.6	94964	SINAPI CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM		m³	7,48	408,41	R\$ 3.742,82	3,22 %	7,63	100%	R\$ 3.742,82	7,63	100%	R\$ 3.742,82	0,00	0%	R\$ -
2.7	103319	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE		m²	140	95,74	R\$ 16.098,60	13,35 %	140,00	100%	R\$ 16.098,60	140,00	100%	R\$ 16.098,60	0,00	0%	R\$ -
2.8	98562	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =		m²	45,28	52,91	R\$ 2.264,00	2,48 %	45,28	100%	R\$ 2.264,00	45,28	100%	R\$ 2.264,00	0,00	0%	R\$ -
2.9	89509	SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 09/2022		M	1	24,41	R\$ 29,31	0,03 %			R\$ 29,31			R\$ 29,31	1,00	100%	R\$ 29,31
3		Acabamentos					R\$ 3.145,60				R\$ 3.145,60			R\$ 3.145,60			R\$ 45.711,64
3.1	87893	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL.		m²	320	8,19	R\$ 3.145,60	2,71 %			R\$ 3.145,60			R\$ 3.145,60	320,00	100%	R\$ 3.145,60
3.2	COTAÇÃO 1	Plópio		m²	320	37,12	R\$ 14.265,60	14,01 %			R\$ 14.265,60			R\$ 14.265,60	320,00	100%	R\$ 14.265,60
3.3	94221	SINAPI CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIU TRANSPORTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM		M	56,6	24,98	R\$ 1.698,00	2,02 %			R\$ 1.698,00			R\$ 1.698,00	56,60	100%	R\$ 1.698,00
3.4	104789	SINAPI REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023		m³	14,34	258,23	R\$ 4.447,69	3,83 %	14,34	100%	R\$ 4.447,69	14,34	100%	R\$ 4.447,69			R\$ 4.447,69
3.5	85387	SINAPI REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO		m³	14,34	101,41	R\$ 1.746,61	1,60 %			R\$ 1.746,61			R\$ 1.746,61	14,34	100%	R\$ 1.746,61
3.6	94994	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS		m²	204,91	77,43	R\$ 18.056,63	16,28 %			R\$ 18.056,63			R\$ 18.056,63	204,91	100%	R\$ 18.056,63
3.7	99626	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS		m²	320	13,32	R\$ 5.120,00	6,10 %			R\$ 5.120,00			R\$ 5.120,00	320,00	100%	R\$ 5.120,00
3.8	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA		m²	226,4	2,50	R\$ 679,20	1,10 %			R\$ 679,20			R\$ 679,20	226,40	100%	R\$ 679,20
CÂMARA MUNICIPAL DE PARQUEIRA-ACU																	
Total do BDI							R\$ 86.587,28				R\$ 86.587,28			R\$ 86.587,28			
Total Geral							R\$ 109.000,00				R\$ 109.000,00			R\$ 109.000,00			R\$ 45.740,95

Partiçuera - Acia, 11 de novembro de 2024.

WASHINGTON
Assinado de forma
electrónica
WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:2063811
8000157
Dados: 2024.11.11
104024-03907

Washington Timóteo da Lima - ME
CNPJ nº 20.538.118/0001-57


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Empresa: WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA – ME-CNPJ Nº: 20.638.118/0001-57.

Contrato: Nº 008/2024.

LOCAL: Contratação de serviço de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obra civil de construção de muro de arrimo, muro de fechamento de 2 (dois) metros de altura e piso estrutural em concreto armado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.



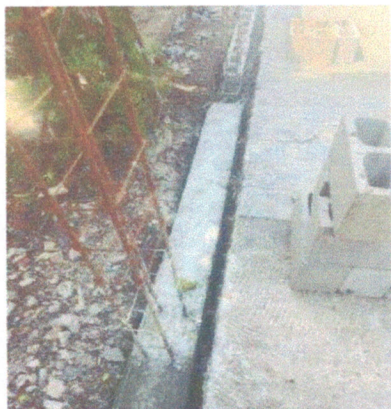



PARIQUERA-AÇU, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

**WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:206381180
00157**

Assinado de forma digital
por WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:20638118000157
Dados: 2024.11.11
10:40:40 -03'00'

WASHINGTON TIMÓTEI DE LIMA – ME

CNPJ nº 20.638.118/0001-57

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA

A

Câmara Municipal de Pariquera Açu/SP.

Concorrência Eletrônica nº 001/2024.

Processo Nº: 597.217.211.410.114.354

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obra civil de construção de muro de arrimo, muro de fechamento de 2 (dois) metros de altura e piso estrutural em concreto armado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

A empresa Washington Timóteo de Lima – ME, com sede na Rua da Fazenda, 164, Bairro Vila Florindo, CEP: 11800-000, Cidade: Juquiá, Estado: São Paulo, telefone: (13) 3844-3378, e-mail: construtoratimoteodelima@hmail.com, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.638.118/0001-57, Inscrição Estadual e/ou Municipal nº 409.018.670.110, neste ato representada por seu Washington Timóteo de Lima (administrador/proprietário), apresenta sua proposta para a prestação do serviço na forma abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSE R	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Elaboração de projeto executivo e execução de obra civil de construção de muro de arrimo, muro de fechamento de 2 (dois) metros de altura e piso estrutural em concreto armado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e projeto básico.	22225	Serviço	01		R\$ 104.000,00 (Cento e quatro mil).

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II e Projeto Básico – Anexo I do Edital.
Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, uniformes, alojamento, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

Os custos decorrentes do fornecimento, contendo a descrição de cada um dos itens que compõem o grupo licitado, estão detalhados na planilha de custos e formação de preços que acompanha essa proposta.

Obs.: Prazo da validade da proposta: 60 dias

Empresa: Washington Timóteo de Lima – ME

Razão Social: Washington Timóteo de Lima – ME

CNPJ: 20.638.118/0001-57

Endereço: Rua da Fazenda, 164 Bairro Vila Florindo – Juquiá - SP

Pessoa para contatos: Washington Timóteo de Lima

Telefone : (13) 99738-2904

E-mail: washingtonlima6123@gmail.com

Banco do Brasil AG: 2228-4 CONTA: 16.016-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA- AÇU			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais		
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO DE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA COM CORREÇÃO DE BOLSÕES DE AR QUE POSSAM TER SE FORMADO ENTRE A DIVISA MURADA E O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE INFILTRAÇÕES	SINAPI - 04/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo	20,11%		Não Desonerado: Horista: 115,54% Mensalista: 71,46%		
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.159,32	6,63 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	2,5	320,19	384,58	R\$ 961,45	0,83 %
1.2	COTAÇÃO	Próprio	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	1	1.950,30	2.342,50	R\$ 2.342,50	2,48 %
1.3	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,74	150,55	180,82	R\$ 2.303,64	1,98 %
1.4	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	12,74	101,41	121,80	R\$ 1.551,73	1,34 %
2			MURO					R\$ 46.681,35	43,82 %
2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	m²	1,76	256,34	307,88	R\$ 541,86	0,47 %
2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	m³	0,09	152,65	183,34	R\$ 16,50	0,01 %
2.3	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM	M	56	63,33	76,06	R\$ 4.259,36	3,67 %
2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	m²	84,36	80,76	97,00	R\$ 8.182,92	8,65 %
2.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	KG	539,28	17,83	21,41	R\$ 11.545,98	9,95 %
2.6	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	m³	7,63	408,41	490,54	R\$ 3.742,82	3,22 %
2.7	103319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE	m²	140	95,74	114,99	R\$ 16.098,60	15,35 %

2.8	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,	m²	45,28	52,91	50,00	R\$	2.264,00	2,48 %
2.9	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	1	24,41	29,31	R\$	29,31	0,03 %
3			Acabamentos						R\$ 50.159,33	49,55 %
3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,	m²	320	8,19	9,83	R\$	3.145,60	2,71 %
3.2	COTAÇÃO 1	Próprio		m²	320	37,12	44,58	R\$	14.265,60	14,01 %
3.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM	M	56,6	24,98	30,00	R\$	1.698,00	2,02 %
3.4	104789	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,34	258,23	310,16	R\$	4.447,69	3,83 %
3.5	85387	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	m³	14,34	101,41	121,80	R\$	1.746,61	1,50 %
3.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8	m²	204,91	77,43	93,00	R\$	19.056,63	18,28 %
3.7	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS	m²	320	13,32	16,00	R\$	5.120,00	6,10 %
3.8	9537	SINAPI	DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	226,4	2,50	3,00	R\$	679,20	1,10 %
									CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	86.587,29
									Total do BDI	17.412,71
									Total Geral	104.000,00

CRONOGRAMA – FÍSICO

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO DE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA COM CORREÇÃO DE BOLSÕES DE AR QUE POSSAM TER SE FORMADO ENTRE A DMSA MURADA E O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE INFILTRAÇÕES		SINAPI - 04/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo	20,11%	Não Desonerado: Horista: 115,54% Mensalista: 71,46%	

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.159,32	100,00% 7.159,32		
2	MURO	100,00% 46.681,35	0,39% 182,06	99,61% 46.499,29	
3	Acabamentos	100,00% 50.159,33			100,00% 50.159,33
Porcentagem			6,8%	43,65%	49,55%
Custo			7.341,38	46.499,29	50.159,33
Porcentagem			6,8%	50,45%	100,0%
Custo Acumulado			7.341,38	53.840,67	104.000,00



Washington Timóteo de Lima- ME
Rua da Fazenda, 164, Vila Florindo / Juquiá-SP - CEP:11.800-000
Telefone: (13) 3844-3378 / Celular: (13) 99738-2904
E-mail: construtoratimoteodelima@gmail.com

Pariquera-Açu, 12 de setembro de 2024

WASHINGTON
N TIMOTEO
DE
LIMA:206381
18000157

Assinado de forma
digital por
WASHINGTON
TIMOTEO DE
LIMA:2063811800015
7
Dados: 2024.09.12
12:18:12 -03'00'

Washington Timóteo de Lima – ME
CNPJ nº20.638.118/0001-57
